

◆工事概要

工事場所：高知県香美市土佐山田町京田地先
 工期：令和4年4月18日～令和5年3月31日（工事期間変更）
 工事概要：河川土工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工
 発注者：国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所
 受注者：福留開発株式会社




◆現在の進捗状況

1月から、現場では覆土工が始まりました。現在、多くの大型車両が道幅の狭い堤防上を通行しています。安全第一で作業を進めていくために、法定速度の厳守・交通誘導員の配置を行い、一般車両優先で作業を行います。地域の皆様、堤防上・仮設道路を通行する方々には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。



現在の進捗状況
 （ドローンによる空撮）

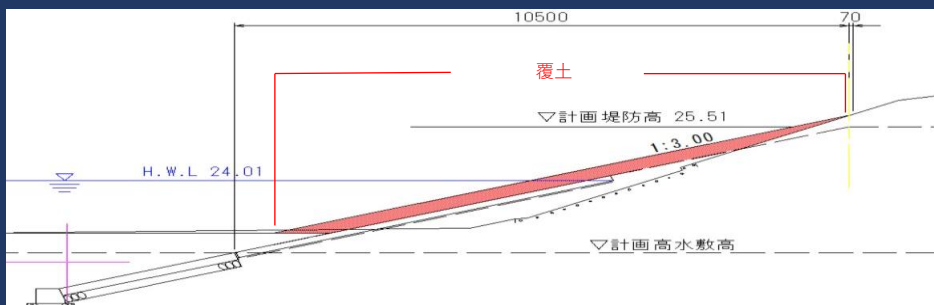


施工図面
 （赤・・・覆土箇所）

◆現場での取り組み

本工事は、若手技術員が3名います。その為、担い手確保のために若手技術員は様々なことを行っております。4年目の技術員は工事に必要な3次元設計データを作成しています。新入生は作成したデータとリンクした快測ナビを使用し、測量を行っております。このように事務所でも、現場でも若手技術員が活躍しています。



3次元設計データ作成
 （4年目）

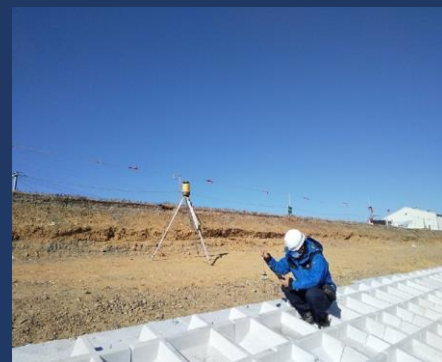

快測ナビによる測量
 （新入生）

◆連絡事項

1月中旬より堤防上を通行の皆様には、高水敷の県道迂回路を通行していただいております。県道迂回路と堤防上の合流箇所は視界も悪くなっていますので、車のスピードを落としていただくようご協力お願い致します。

