

### 高知港三里地区防波堤(南)工事(その(2))


工事場所：高知県高知市仁井田4566-1

契約工期：令和2年7月15日～令和2年12月21日

請負金額：¥96,393,000-

発注者：国土交通省 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所

工事概要：高知港三里地区防波堤(南)の消波工を施工する工事で、テトラポッド(80 t型)を120個製作します。

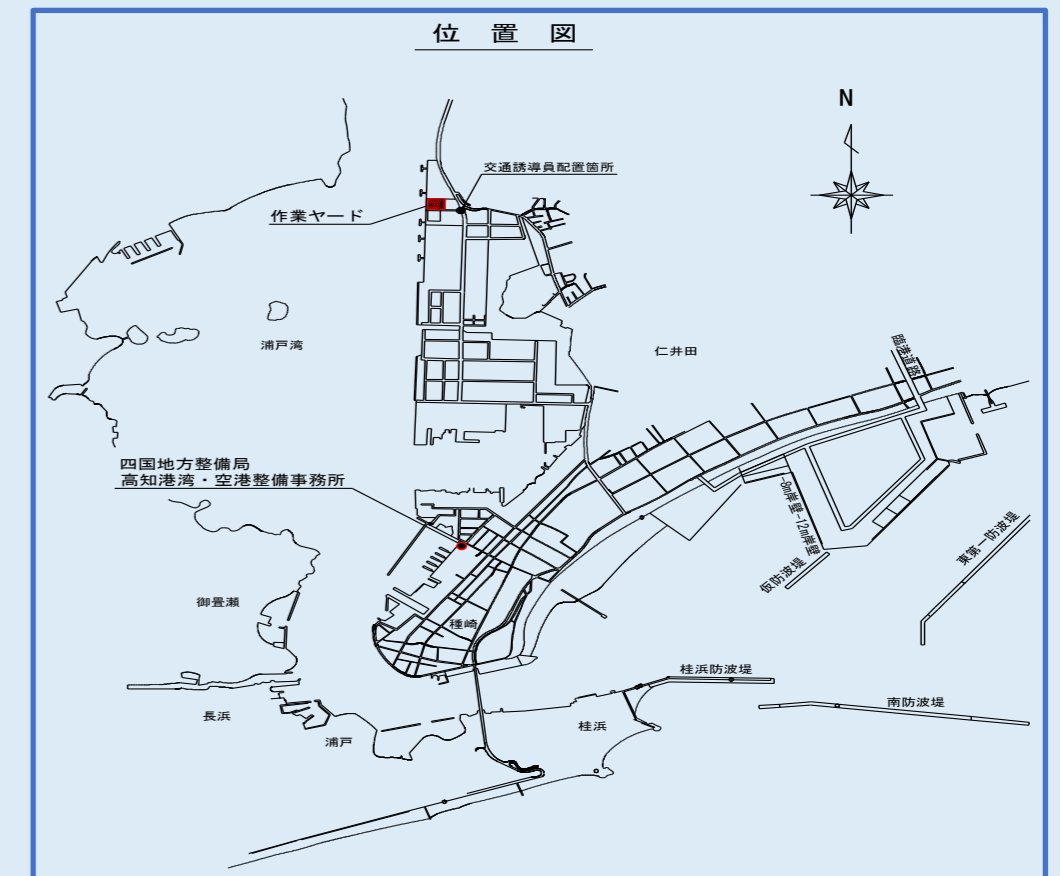


#### ① ブロック製作


ブロック製作作業は、ラフタークレーン25t吊にて、型枠組立・脱型、コンクリート打設専用足場を使用し安全に作業を行っています。




1. 下部型枠組立

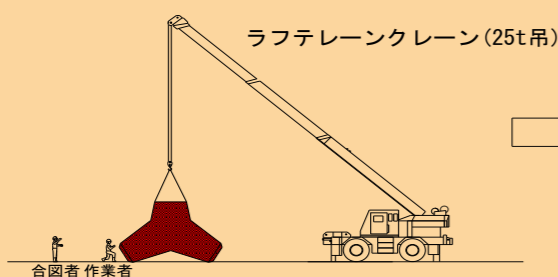


2. 下部コンクリート打設

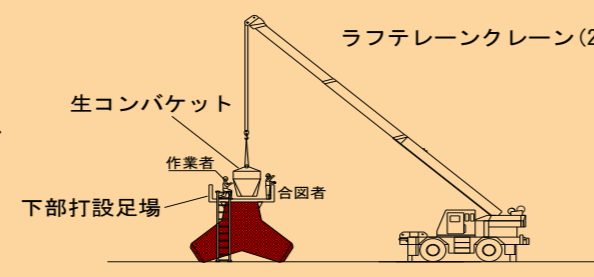


3. 上部型枠組立

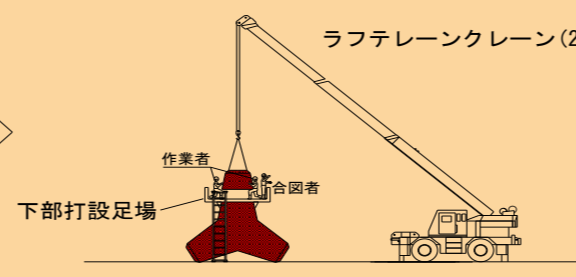

4. 上部コンクリート打設

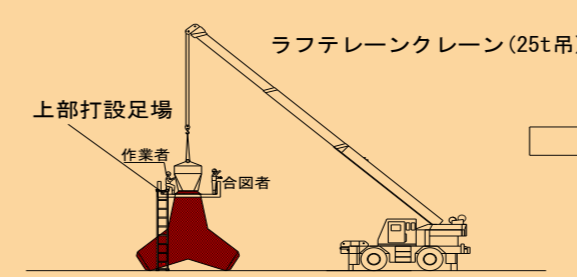


5. 型枠脱型

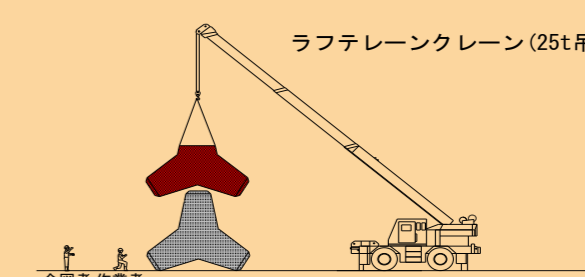


#### ② ブロック転置・仮置

ブロック転置作業は、クローラークレーン200t吊にて、専用サスペンダーを使用して、ブロックが傷つかないように注意しています。ブロック仮置き作業は、玉掛けワイヤーを使用して、安全には十分に注意し、2層積みを行っています。

7. 転置

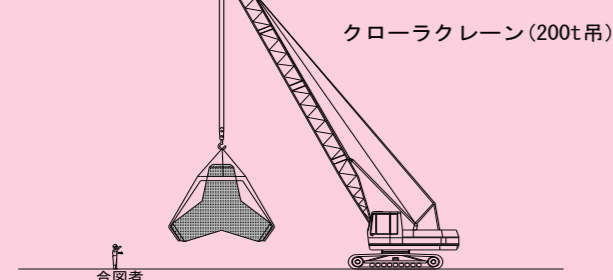

8. 仮置

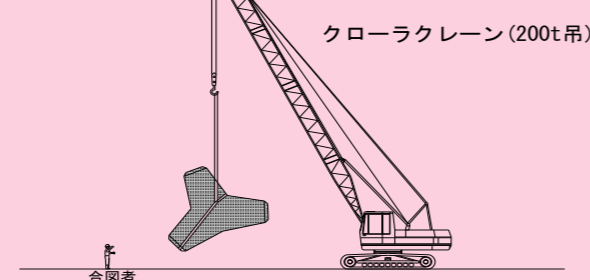

#### 新入社員修行中

島田 有(しまだ ゆう)

高知工業土木科卒

ラグビー部(FW)

まだわからないことも多く、戸惑ってばかりですが少しずつでもできることを増やして、どんどん成長していきたいです。今回の工事は構造物も使用機械も大きいものばかりなので、現場の安全には十分注意しながら業務にあたりたいと思います。

